


# PLANNING HERBOUW DE BEECK

versie: 12 juli 2018



STRAMAN Management en Advies B.V. 6065/dW/SO

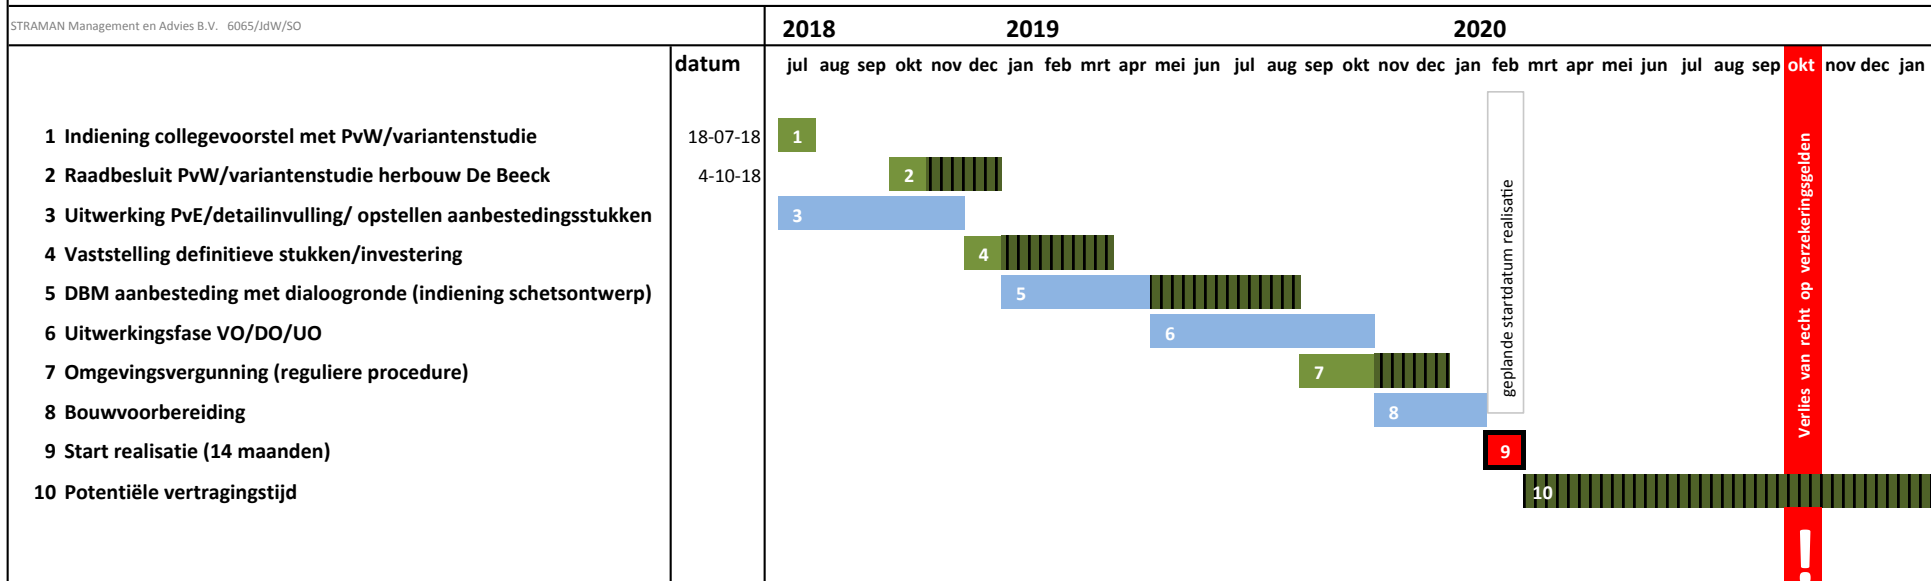

Potentiële vertragingen (in groene gestreept weergegeven):

- 2 Bij het uitblijven van een raadsbesluit is de waarschijnlijke vertraging minimaal 2 maanden
- 4 Bij het uitblijven van vaststelling van de definitieve plannen en investering is de waarschijnlijke vertraging 3 maanden
- 5 De DBM aanbesteding kan door vragen, mislukte aanbesteding (komt veel voor op dit moment) en bezwaarprocedures 2 maanden vertraging oplopen
- 7 De omgevingsvergunning kan met 6 weken uitgesteld worden
- 10 De totale potentiële uitlooptijd is meer dan aan uitloopmogelijkheid beschikbaar is! Een totale uitloopmogelijkheid van 6 maanden is zeer kort voor een project van deze omvang.
